

LEGENDA:


	– Campo Fotovoltaico
	– Disjuntor
	– Disjuntor Magnético Térmico
	– DPS classe II
	– Inversor
kWh	– Medidor Bidirecional

LEGENDA:

	–
DPS	– Caixa com Protetores de Surto
	–
	– Quadro Geral
	– Eletroduto Flexível
	– Neutro, Fase, Terra, Condutor Positivo, Condutor Negativo

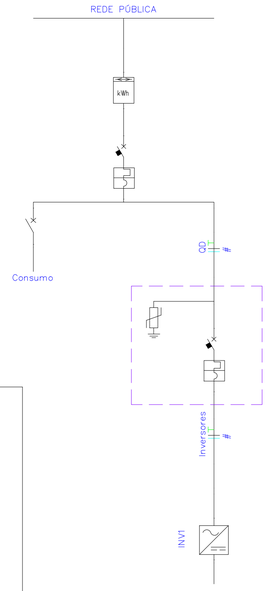

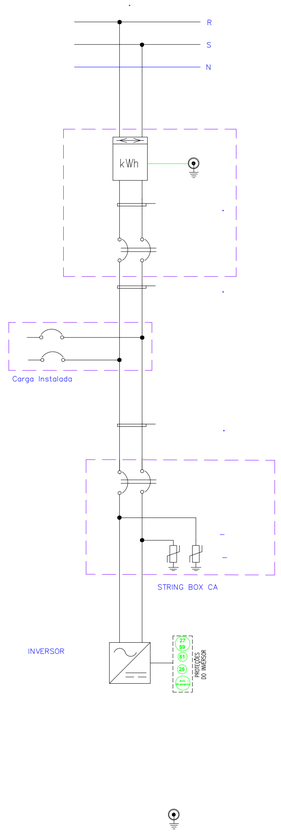

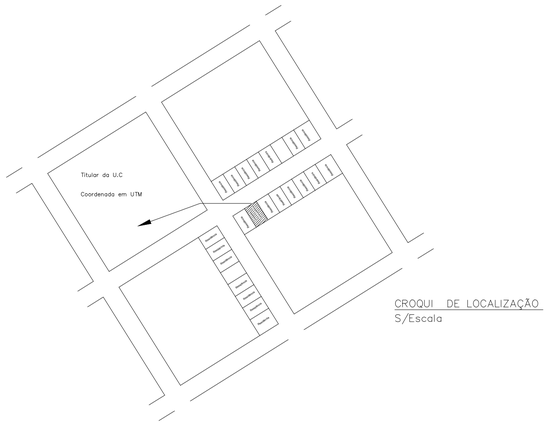

NOTAS OBRIGATÓRIAS

1. O inversor será instalado em local de fácil acesso;
2. Somente deverá injetar energia na rede elétrica apos a instalação do medidor bidirecional por parte da Energisa;
3. O padrão de energia está em condições técnicas de conservação próprias para instalação do medidor de energia;
4. As instações serão executadas de acordo com a NBR 5410 e NBR 14039 da ABNT;
5. Todos os disjuntores serão certificados pelo INMETRO;
6. A aprovação da vistoria pela Energisa, referente a obra deste projeto, fica condicionada a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou do TRT (Termo de Resposabilidade Técnica) de execução visada no CREA ou CFT da localidade;
7. A placa de advertência deverá ser confeccionada em PVC\acrilico com espessura minima de 1 mm.
8. O(s) inversor(es) da central geradora deverão ser instalados em local de facil e permanente acesso, onde o visor deverá ficar a uma altura máxima de 1,60m do piso acabado ao seu topo.

BREVE DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

O projeto preve a instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica conectado ao sistema de distribuição em BT da Energisa para acesso à microgeração, com potência instalada menor que 75 KW e com adesão ao sistema de compensação de energia.

LEGENDA ESPECÍFICA DOS EQUIPAMENTOS

Disjuntor Bipolar

Medidor Bidirecional

Seccionadora CC

DPS CA Classe II

QGBT

DPS CC

Fusível Gpv


INV1

Inversor Solar On Grid Conectado à Rede.

Caixa de Aterramento

Projeto Fotovoltaico ON–GRID

1) Módulos (Placas)



–

Potência unitária (W):
Tensão unitária (V):
Corrente de operação (A):

2) Strings

Placas por String:
Potência (KW):
Tensão (V):

STRINGS	NUMERO DE MODULOS	POTENCIA POR STRINGS (kW)	TENSÃO DE OPERAÇÃO POR STRING (V–DC)	CORRENTE DE OPERAÇÃO (A–DC)	Cabo(mm²)	Queda Tensão (V/A*km)	Distância (m)	Queda Tensão (V)	Queda Tensão (%)
TOTAL (KW)									


3) Inversores

Strings por Inversor:
Potência (KW):

INVERSOR	NÚMERO DE STRINGS	NÚMERO DE MÓDULOS	EFIC. (%)	POTÊNCIA P/INVERSOR (kW)	TENSÃO DE OPERAÇÃO DO INVERSOR(Vac)	FATOR DE POTÊNCIA	CORRENTE DE OPERAÇÃO (A–DC)	Cabo(mm²)	Queda Tensão (V/A*km)	Distância (m)	Queda Tensão (V)	Queda Tensão (%)
INV1												

4) Total

Número de Inversores:
Potência Total (KW):

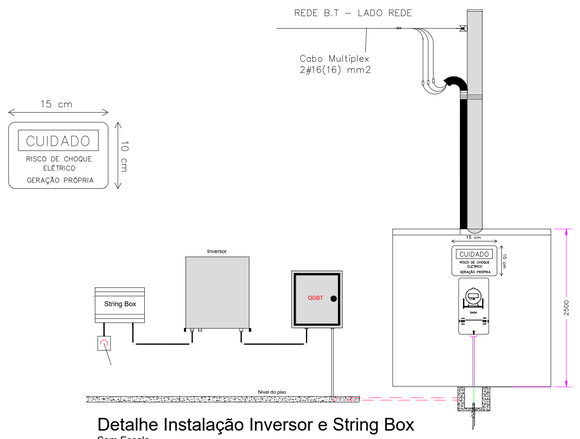

Detalhe Instalação Inversor e String Box
Sem Escala

DADOS DO PROJETO

PROPRIETARIO:

ENDEREÇO:

RESP. TECNICO:

COORDENADAS GEOGRAFICAS (UTM):

X:

Y:

VISTORIADO E APROVADOR POR:

Data:

Nº Projeto Elétrico:

Analisado por:

Aprovado por:

O acessante deve solicitar a vistoria à distribuidora em até 120 (cento e vinte) dias após a emissão do parecer de acesso. A inobservçancia do prazo estabelecido acima implica na perda das condições de conexão estabelecidas no parecer de acesso, exceto se um novo prazo for compactuado entre as partes.

PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA

RESP. TECNICO:	PROPRIETARIO:

PROJETO: Projeto da Planta Fotovoltaica - Detalhes

DATA:

ESCALA: Indicada

DESENHO: CAD

ART/TRT:

FOLHA: 1/1
